



Figura 12: Beneficiarios trabajando en la construcción de su nueva vivienda

- Se cuenta con un expediente técnico y un manual de construcción para viviendas de adobe sismo resistentes de bajo costo, conteniendo toda la información necesaria para su replicabilidad.
- Se difundió una técnica de cobertura de techos con tejas de micro concreto a un costo moderado, que en comparación con techos de lámina, preserva la fisonomía del paisaje andino tradicional y ofrece un mejor aislamiento térmico

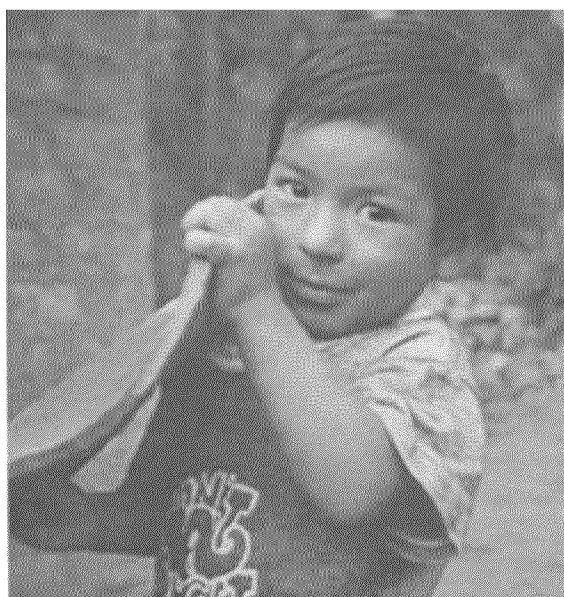


Figura 13: Niño cargando una teja de micro concreto

Inclusión de la gestión de riesgo

- Una parte importante de la población en el área de intervención del proyecto fue sensibilizada en temas de gestión de riesgo, como por ejemplo las amenazas existentes, las vulnerabilidades de las localidades y de las construcciones de adobe, así como una técnica sismo resistente
- Dado el contexto de emergencia en el cual se desarrolló el proyecto, se implementaron medidas básicas de gestión de riesgo. Ellas, juntos a los resultados mencionados anteriormente, crearon una base para el desarrollo de un nuevo proyecto a partir de 2003, el cual tiene un enfoque integral, más amplio y sistemático para la inclusión de la gestión de riesgo en la zona afectada.

Reconstrucción de infraestructura de riego

- Se rehabilitaron 15 sistemas de riego (1 500 metros lineales de canales, dos bocatomas y dos reservorios de un total de 4.000 m³), y se reconstruyeron 3.000 metros lineales de canales, permitiendo la continuidad de la campaña agrícola del 2001/2002 para cerca de 10 000 ha de cultivo.
