

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS
DE DEFENSA CIVIL MUNICIPAL
EN LA ZONA NORTE DE CHINANDEGA Y LEÓN**

RESUMEN EJECUTIVO

*Arq. Ansia Alvarez Estrada
Coordinadora de Proyecto*

León, 01 de Diciembre de 1999



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

I.- INTRODUCCIÓN:

Como consecuencia del Huracán Mitch a su paso por Centroamérica y especialmente por nuestro país, dejó al descubierto las debilidades que en materia de Defensa Civil tenían los municipios, principalmente en lo referente a organización y capacitación, esto en su momento se ha vuelto una preocupación tanto de los gobiernos locales como de la Dirección de Defensa Civil y es así que a partir de una solicitud presentada al Proyecto de Desarrollo Rural Chinandega León (PROCHILEON IDR-GTZ) y a la Fundación Friedrich Ebert nace lo que hoy se conoce como **Proyecto de Fortalecimiento de las Estructuras de Defensa Civil Municipal en la Zona Norte de Chinandega y León.**

Es a inicios del mes de mayo que se realizan las tareas de coordinación y de firmas de actas de entendimiento entre las alcaldías beneficiadas, las secretarías de la presidencia de la República, delegados departamentales de las Instituciones gubernamentales y la Defensa Civil, todas ellas con el fin de garantizar el buen desarrollo de las actividades del proyecto y el apoyo que en determinado momento se les solicitaría.

En la ejecución del proyecto ha sido de gran importancia el aporte que la Dirección de Defensa Civil nos ha brindado como organismo responsable de coordinar la planificación, organización, dirección y control de las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres y/o emergencias en el ámbito nacional, la cual funciona dentro de una estructura permanente del Sistema Nacional de Defensa Civil.

En tanto, para ejecutar los fondos aprobados no se podía perder tiempo, ya que las lluvias de Mayo ya estaban por iniciar y es así que se ejecuta la etapa de organización y capacitación casi en un tiempo récord y se procede a equipar a los municipios, así como a preparar los respectivos planes de emergencias en los meses siguientes. Todo este proceso dura desde el 17 de Mayo hasta el 1 de Agosto cuando clausuramos con los ejercicios demostrativos y entrega oficial de las Brigadas a las Municipalidades, las cuales en estos momentos quedan equipadas.

Hasta el día de hoy 1 de Diciembre se puede decir que hemos cumplido con el compromiso que adquirimos en el mes de Abril y hemos apoyado a los Comités Departamentales de Defensa Civil, Defensa Civil Región II durante las emergencias que se presentaron en la zona a partir del mes de Agosto (Emergencia Cerro Negro, Ondas Tropicales, Inundaciones en la zona de La Paz Centro, Volcán San Cristobal), desde ya nos encontramos preparando las acciones que emprenderemos a partir de Enero del año 2,000.

II.- AGRADECIMIENTO:

Por este medio el Proyecto de Fortalecimiento de las Estructuras de Defensa Civil Municipal en la Zona Norte de Chinandega y León, quiere patentizar su agradecimiento a aquellas personas que hicieron posible la realización de este proyecto mediante su trabajo tesonero y su decidido apoyo al mismo.

A los donantes de este proyecto, Proyecto de Desarrollo Rural Chinandega León (IDR – GTZ), Fundación Friedrich Ebert y Dirección de Defensa Civil, los que confiaron y que siempre estuvieron seguros del beneficio que estaban entregando a estos municipios. Ayudar a prevenir y mitigar, así como salvar vidas es más que una buena recompensa.

Dirección (EM) Defensa Civil

Coronel José García Estrada
Teniente Coronel Mario Pérez Cassar Pereira
Mayor Norman Sánchez
Comunicador Oscar Sandoval

Cuerpo de Instructores Nacionales:

Mayor Gilberto Narváez. Jefe de la Sección de Defensa Civil II Región.
Capitán Juan Pablo Marengo
Capitán Arturo Rivera
Capitán Epifanio Tórrez.
Capitán Carlos Cáceres
Teniente Primero Dionisio Narváez
Capitán Héctor Escoto

Cuerpo de Instructores Regionales:

Leonel Ramos
Leonel Juárez
Sebastián Ruíz
Fabio Benedith
Cornelio Santana
Ramón Betancourt
Mauricio Amaya
Marlon Sánchez
José Ramón Andrade

Ejército de Nicaragua:

Estado Mayor Región II (Chinandega). 2do. Comando Militar Regional

Alcaldes:

Sr. Cruz Zepeda. Alcalde de San Pedro.
Sr. Henry Maradiaga. Alcalde de San Juan de Cinco Pinos.
Sr. José Dolores Espinal. Alcalde de Santo Tomás del Norte.
Sr. Alexander Baquedano. Alcalde de San Francisco del Norte.
Sr. Justino Quintero. Alcalde de Somotillo.
Sr. Luís Guerrero. Alcalde de Villa Nueva.
Sra. María Teresa Vélez. Alcalde de El Jicaral.
Sr. Ramiro González Rico. Alcalde de Santa Rosa del Peñón.
Sr. Milán Valenzuela. Alcalde de San José de Achuapa.
Sr. Alfonso Narváez. Alcalde de El Sauce.

Don Enrique Suárez

Representante en Nicaragua
Cruz Roja Española

Secretaría de Gobierno:

Prof. Bayardo Urcuyo
Departamento de Chinandega

Lic. Carlos Gurdían
Departamento de León

Miembros de los Comités Municipales de Defensa Civil y Brigadistas de los diferentes municipios, sin ellos no hubiese sido posible este proyecto


Personal administrativo del Proyecto Prochileón (IDR – GTZ) y Conductores

Si olvidamos a alguien pedimos disculpas.

III.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Municipios de Chinandega Norte: San Pedro, San Francisco, Cinco Pinos, Santo Tomás, Somotillo y Villa Nueva.

Municipios de León Norte: Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral.

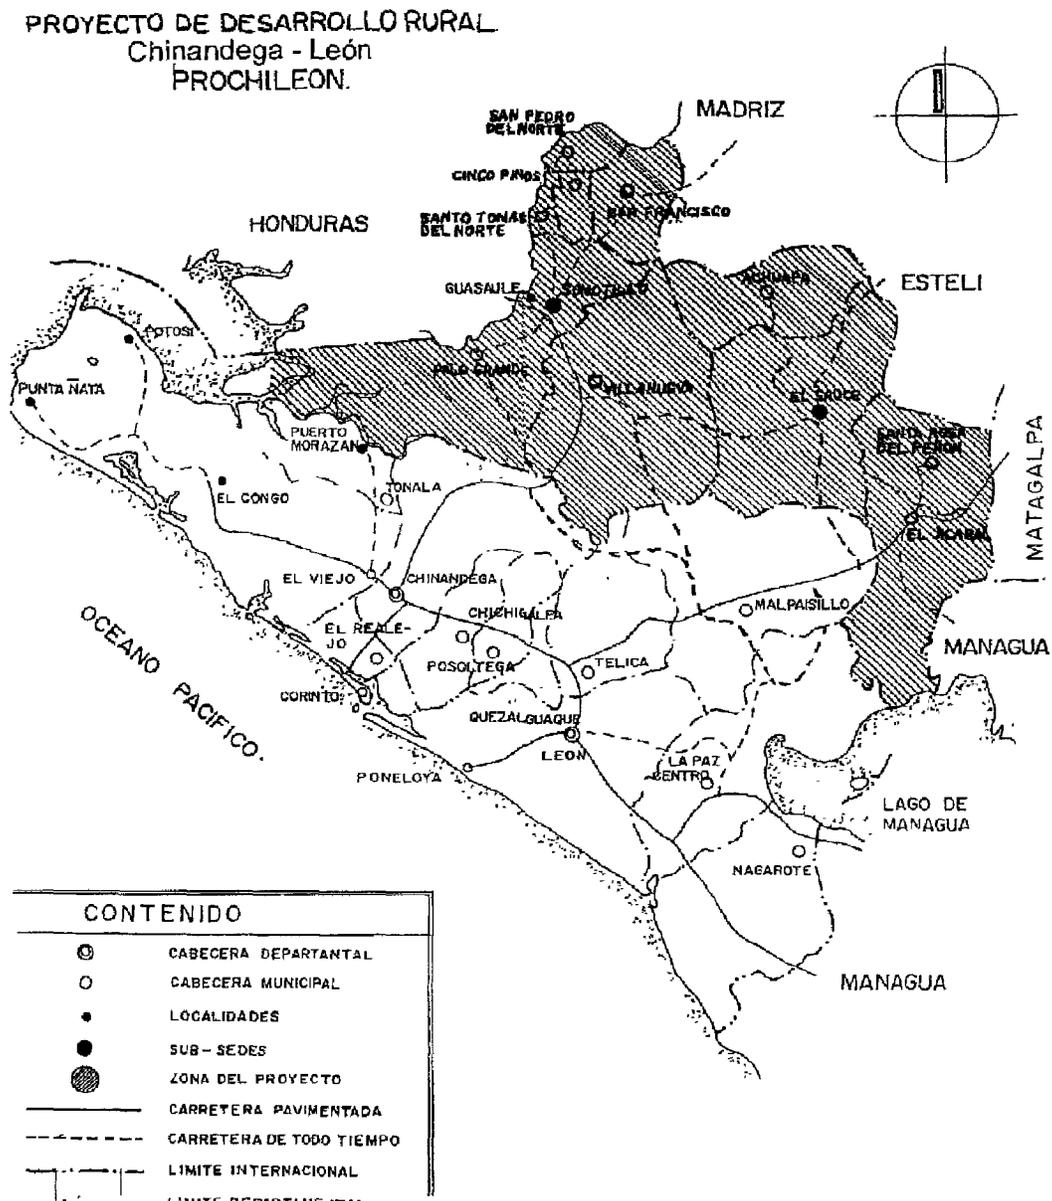

IV.- OBJETIVOS:

4.1.- Generales:

- ❑ Incrementar la capacidad de prevención y respuesta de la población ante situaciones de desastres y emergencia, así como disminuir su vulnerabilidad.
- ❑ Prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales, para reducir las pérdidas de vidas humanas, infraestructura material y económica, a través de los planes y estudios técnicos especializados.
- ❑ Crear y fortalecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones en cada municipio.
- ❑ Disponer de recursos materiales y humanos, que apoyen en las situaciones de emergencia y desastres de cada municipio.
- ❑ Dar a conocer a la población, a través de las estructuras organizativas de los municipios el funcionamiento de los Comités de Defensa Civil Local, a fin de lograr la participación activa de las autoridades y de la comunidad.

4.2.- Específicos:

- ❑ Organizar 10 Comités de Defensa Civil Municipales.
- ❑ Capacitar a los 10 Comités Municipales y a las brigadas de Primeros Auxilios y Búsqueda, Salvamento y Rescate.
- ❑ Elaborar Plan de Emergencia por cada municipio(mapa de amenaza, riesgo y emergencia).
- ❑ Realizar ejercicio demostrativo en cada municipio.
- ❑ Equipar a las municipalidades para el funcionamiento de las brigadas en situación de emergencia.



**PASE DE CIRCUNSTANCIA
EN CAMILLA CON UN PACIENTE**



RESCATE DE UNA VICTIMA DESDE PUENTE

V.- ESTRATEGIA DE TRABAJO

Para lograr ejecutar el proyecto en tiempo y forma previamente establecido, se procedió a entrar en el territorio de tal manera que fuésemos cubriendo la zona y que los instructores no regresaran a la sede sin antes dejar preparada en primer lugar Chinandega y a continuación León. Para tal efecto, se formaron dos equipos tanto de instructores nacionales como regionales, los cuales, trabajaban de forma paralela en los mismos sectores. Es esta forma de trabajo que marca las siguientes estrategias a utilizarse por el proyecto y la Dirección de Defensa Civil, la que nos muestra como en poco tiempo podemos optimizar al personal y equipos.

Cuadro No. 1

TABLA DE MOVILIZACION DE PERSONAL DURANTE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO.

No.	MUNICIPIO	FECHA	C.D.C. ¹	FECHA	B.P.A. ²	FECHA	B.S.R. ³
1.-	CINCO PINOS	16-18/5/99	✓	16-20/5/99	▲	16-20/5/99	▲
2.-	SAN PEDRO	16-18/5/99	✓	16-20/5/99	▲	16-20/5/99	▲
3.-	SANTO TOMAS	18-20/5/99	✓	20-24/5/99	▲	20-24/5/99	▲
4.-	SAN FRANCISCO	18-20/5/99	✓	20-24/5/99	▲	20-24/5/99	▲
5.-	SOMOTILLO	20-22/5/99	✓	24-28/5/99	▲	24-28/5/99	▲
6.-	VILLA NUEVA	20-22/5/99	✓	24-28/5/99	▲	24-28/5/99	▲
7.-	JICARAL	25-26/5/99	✓	2-5/6/99 ⁴	▲	2-5/6/99	▲
8.-	SANTA ROSA	25-26/5/99	✓	2-5/6/99 ⁵	▲	2-5/6/99	▲
9.-	ACHUAPA	26-28/5/99	✓	5-9/6/99	▲	5-9/6/99	▲
10.-	SAUCE	26-28/5/99	✓	7-9/6/99	▲	7-9/6/99	▲

¹ C.D.C. (Comité de Defensa Civil)

² B.P.A. (Brigada de Primeros Auxilios)

³ B.S.R. (Brigada de Búsqueda, Salvamento y Rescate)

⁴ Los instructores regionales fueron trasladados a León por la Defensa Civil Regional desde el día 4 de Junio, a excepción de instructor de P.A. e instructor nacional.

⁵ Los instructores regionales fueron trasladados a León por la Defensa Civil Regional desde el día 4 de Junio, a excepción de instructor nacional.

Cuadro No. 2

TABLA RESUMEN DE CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO.

No.	MUNICIPIO	FECHA	C.D.C. ¹	FECHA	B.P.A. ²	FECHA	B.S.R. ³	TOTAL /MUNC.
1.-	CINCO PINOS	17-18/5/99	20	17-20/5/99	16	17-20/5/99	15	51
2.-	SAN PEDRO	17-18/5/99	38	17-20/5/99	15	17-20/5/99	16	69
3.-	SANTO TOMAS	19-20/5/99	35	21-24/5/99	15	21-24/5/99	18	68
4.-	SAN FRANCISCO	19-20/5/99	19	21-24/5/99	18	21-24/5/99	14	51
5.-	SOMOTILLO	21-22/5/99	24	25-28/5/99	10	25-28/5/99	12	46
6.-	VILLA NUEVA	21-22/5/99	28	25-28/5/99	16	25-28/5/99	16	60
7.-	JICARAL	25-26/5/99	27	2-5/6/99	16	2-5/6/99	16	59
8.-	SANTA ROSA	25-26/5/99	22	2-5/6/99	15	2-5/6/99	15	52
9.-	ACHUAPA	27-28/5/99	22	6-9/6/99	15	6-9/6/99	16	53
10.-	SAUCE	27-28/5/99	23	7-9/6/99	17	7-9/6/99	18	58
	TOTAL DE PART.		258		153		156	567

En tanto, al finalizar la etapa de capacitación se procede inmediatamente el día 14 de Junio a la elaboración de los Planes de Emergencia los cuales pasaron posteriormente revisión en la Dirección de Defensa Civil, a continuación se elaboraron los Mapas de Riesgos, Amenazas y Emergencias. Al concluir esta etapa se procede el día 17 de Julio a realizar los primeros ejercicios demostrativos entrega de equipos, planes de emergencias con sus respectivos mapas, este proceso lo concluimos el día 1 de Agosto del año en curso. Para estas actividades utilizamos la misma lógica de trabajo con la que se realizó la etapa de capacitación.

¹ C.D.C. (Comité de Defensa Civil)

² B.P.A. (Brigada de Primeros Auxilios)

³ B.S.R. (Brigada de Búsqueda, Salvamento y Rescate)

V.- APORTES DE LOS DONANTES Y OTRAS INSTITUCIONES QUE APOYARON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

DESCRIPCION/APORTE	ORGANISMO
Viáticos p' instructores Nacionales y Regionales	PROCHILEON
Preparación de Material Didáctico	Dirección Defensa Civil
Material didácticos(Reproducción)	PROCHILEON, Fundación Friedrich Ebert
Salarios de Instructores Nacionales	DEFENSA CIVIL
Alimentación a Brigadistas	PROCHILEON
Alimentación para Comités	Fundación Friedrich Ebert
Pago a Instructores Regionales	PROCHILEON
Compra de equipos especiales	PROCHILEON
Pago a oficiales durante la elab. De Planes de Emergencias y Mapas de Riesgos	Defensa Civil PROCHILEON(Viáticos de alojamiento, alimentación y combustibles)
Mapas Topográficos. Esc. 1:50.000	Ejército de Nicaragua/Defensa Civil
Pago o salario de Instructores Nacionales (Oficiales) para la preparación y ejecución de ejercicios demostrativos	DEFENSA CIVIL
Viáticos a instructores Regionales y Nacionales para la preparación y Ejecución de Ejercicios Demostrativos por Municip.	PROCHILEON
Combustible para vehículo de la Defensa Civil	PROCHILEON, Defensa Civil
Medio (Vehículo)	DEFENSA CIVIL
Medios para movilizar personal	PROCHILEON(4 Camionetas 1 camión)
Adendum (Reparación de Jeep destinado al Depto. de Chinandega)	PROCHILEON
Otros aportes	Botiquines (Cruz Roja Española) Material de reposición para capacitaciones (PROCHILEON) y SILAIS, con pequeño aporte)
Convocatoria	PROCHILEON

La ejecución de este proyecto asciende a la suma de U\$80,000 (Ochenta mil Dólares), los cuales fueron asumidos por el Proyecto de Desarrollo Rural Chinandega – León (PROCHILEON IDR-GTZ), Fundación Friedrich Ebert y La Dirección de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua. Las cantidades de dinero gastadas fueron equitativas por municipio, es decir, correspondiendo por cada uno la suma de U\$ 8,000.00.



ENTREGA DE EQUIPOS Y PLANES DE EMERGENCIA A LAS MUNICIPALIDADES



VII.- EQUIPOS ENTREGADOS A LAS ALCALDÍAS.

Se entregaron 10 cajas de madera (1.10m x 1.10m x 0.67m) con sus respectivos candados, las que contienen materiales y equipos que se describen a continuación:

7.1.- Para Brigada de Salvamento y Rescate:

N/O	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Pares de guantes de cuero	156
2	Cuerdas Personales	156
3	Machetes	20
4	Palas	20
5	Cuerda 1 pulgada, 100 varas	10
6	Cuerda 1 pulgada, 50 varas	10
7	Cuerda 3/8 pulgada, 50 varas	10
8	Cuerda Especial HSW 120 pies.	10
9	CMI Clásico Ocho	20
10	Carabiner Hebillón Siher	20
11	Carabiner Omega Cusa Lock	20
12	Harneses Profesionales 038	20
13	Cinturón de Rescate	20
14	Polea Timney 4.5"	10

7.2.- Equipos Personales

N/O	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Lámparas de Mano (Weather Proof)	309
2	Baterías (Unidades)	1236
3	Manuales de Primeros Auxilios	300
4	Botas (Pares)	309
5	Uniformes(Pantalón y Camisa)	99
6	Cascos	309

7.3.- Brigada De Primeros Auxilios:

Se entregaron veinte mochilas botiquines (donados por la Cruz Roja Española), las que fueron complementadas por el proyecto con equipos de Primeros Auxilios

N/O	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Resochin (Caja)	20
2	Parasetamol (Caja)	19
3	Acetaminofen(Unidades)	12
4	Suero Fisiológico (Botella)	40
5	Desinpov (Botella)	20
6	Desinclor (Botella)	20
7	Tijeras Grandes (Unidad)	20
8	Tijera Pequeña (Unidad)	20
9	Pinzas (Unidad)	20
10	Camillas de Aluminio (Unidad)	20
11	Esparadrapo 2 pulg. (Unidad)	20
12	Curitas (unidad)	180
13	Tiritas (Caja)	20
14	Coperta Isotérmica (Unidad) Grande	40
15	Coperta Isotérmica pequeña (Unidad)	20
16	Compresas de Tul engrasadas (Sobre) Grande	80
17	Compresas de Tul Engrasada (Sobre) Pequeña	40
18	Apósitos quirúrgicos (Sobres)	120
19	Guantes (Empaque peq) Pares	100
20	Guantes de 7½ (Pares)	40
21	Vendas Elásticas de Malla (Unidad)	20
22	Venda Elástica de Malla Grande (Unidad)	20
23	Gasas de Malla Grande (Unidad)	80
24	Gasas Pequeñas (Unidad)	60
25	Gasas medianas (Unidad)	100
26	Apósitos de gasa texpo (Sobre)	440
27	Compresas Marrón Grande (Unidad)	80
28	Compresas Marrón Pequeña (Unidad)	140
29	Tablillas grandes (Pares)	30
30	Tablillas Pequeñas (Pares)	30
31	Vendas triangulares de Tela (Unidades)	100
32	Venda Triangular (Europlast)	20

A los miembros de los Comités Municipales e Instructores Nacionales y Regionales se les entregaron camisetas con los distintivos del Proyecto, así mismo, al personal de apoyo del proyecto e invitados especiales. En tanto al Cuerpo de Instructores Regionales y conductor (10 personas) recibieron sus respectivos uniformes anaranjados con los emblemas de PROCHILEON Y Defensa Civil y sus correspondientes apellidos.

VIII.- CUMPLIMIENTO DE METAS:

Al elaborar este proyecto nos habíamos puesto como meta lograr ejecutarlo en cuatro meses, tomando en cuenta que tres meses serían dedicados para ejecutar las etapas en las que estaría involucrada la población y un cuarto mes para la presentación de un libro y la etapa de cierre del proyecto. La meta se ha cumplido:

- Se han organizado y capacitado 10 Comités Municipales de Defensa Civil en los 10 municipios beneficiarios del Proyecto. Para lo cual se contó con la participación de 258 personas.
- Se han organizado, capacitado y equipado 20 brigadas, 10 de Búsqueda, Salvamento y Rescate y 10 de Primeros Auxilios. Con la participación de 309 personas de diferentes edades.
- Se han elaborado 10 Planes de Emergencias, con una edición de 40 ejemplares.
- Se han elaborado 10 mapas de riesgo, amenaza y emergencia, con una edición de 20 unidades.
- Se realizaron 10 ejercicios demostrativos, en igual cantidad de municipios.

Considerando la magnitud del proyecto y el tiempo a ejecutarse, podremos decir con mucho orgullo que esto fue posible gracias al trabajo, disciplina y abnegación de todos los involucrados. El apoyo recibido y la aceptación del proyecto por los beneficiarios fueron muy buenos.

Gracias al aporte de instituciones como la Cruz Roja Española, Ejército de Nicaragua, Delegaciones de Gobierno, el trabajo y el presupuesto que como proyecto teníamos nos permitió cubrir las etapas sin muchos tropiezos.

No obstante nuestra preocupación ha ido más allá y se ha decidido hacer un adendum al proyecto para poder uniformar a todos los Brigadistas y llevar a cabo otra actividad más con la que se refuercen los conocimientos, para esta actividad que consistirá en la realización de un campamento acompañado de una maniobra en la que estarán involucradas las 20 brigadas, solicitaremos el apoyo de todas las instituciones que nos han ofrecido su colaboración. (Actividad a realizarse en la primera Semana de Febrero del 2,000.

Para el seguimiento de este proyecto se está apoyando a la Dirección de Defensa Civil con la reparación de un jeep KIA, asignado al departamento de Chinandega. Los municipios no estarán solos siempre encontrarán en los organismos donante del proyecto una mano amiga.

IX.- CONCLUSIONES Y VALORACIONES DEL PROYECTO:

Según resultados de la reflexión Post – Mitch, realizada por el Proyecto en marzo de este año la mayor debilidad que presentaron las municipalidades fue la falta de organización y en algunos casos de capacidad y preparación para ayudar a los pobladores que sufrieron mayores perjuicios y que ante una nueva situación de emergencia necesitan estar preparados. Es así, que la importancia de este proyecto en beneficio de las poblaciones se vuelve cada día necesario y el momento en que se realiza se puede decir es el adecuado.

Al concluir esta primera etapa nos llena de mucha satisfacción el que hayamos podido realizarla en un corto tiempo (se invirtieron 18 días hábiles de los cuales los días efectivos fueron 14) la organización y capacitación de los Comités Municipales de Defensa Civil de los 10 municipios beneficiarios de este proyecto, esto en términos de personas capacitadas significan 258 habitantes preparados para enfrentar una emergencia, por consiguiente en lo que se refiere a la organización y capacitación de las brigadas de Primeros Auxilios y de Búsqueda, Salvamento y Rescate, (25 días calendario y 21 días efectivos de trabajo) se contabilizan a 309 (237 hombres y 72 mujeres) personas capacitadas. Esto significa un sobrecumplimiento en la convocatoria, por tanto si mencionamos el periodo en que se realizó significa únicamente 4 meses de trabajo en 10 municipios a la vez, los cuales se encuentran enclavados aproximadamente a partir de 116 Km. Aproximadamente de la sede.

Es importante mencionar la disciplina mostrada por los participantes, quienes en un buen número tenían que recorrer grandes distancias para poder capacitarse. La experiencia que le dejó el huracán MITCH, les ha permitido poder entender mejor la necesidad de estar preparados y ayudar a prevenir cualquier desastre dentro de su comunidad. En su mayoría por no decir la totalidad era primera vez que se les mencionaban estos temas, en algunos casos su poco nivel no ha sido traba para que ellos aprendan nuevas técnicas.

En lo referente a la acogida del proyecto por parte de la población beneficiada ha sido muy buena, muestra de esto, que en la mayoría de municipalidades la convocatoria superó el 95% fácilmente y en las que menor asistencia.

Se han aumentado los niveles de coordinación con organismos que trabajan estos mismos temas, así como nuestra presencia en las comisiones de trabajo de los Comités Departamentales de Defensa Civil tanto de Chinandega y de León, Sección de Defensa Civil Regional y apoyo logístico durante las emergencias que se presentaron durante los meses de Agosto a Diciembre(Cerro Negro, Ondas Tropicales, Inundación La Paz Centro, Volcán San Cristóbal).

Hasta la fecha consideramos que existe un vacío en cuanto a la falta de una ley de Defensa Civil que defina los niveles de actuación de los organismos e instituciones tanto públicas como privadas que trabajan en la prevención y mitigación o que forman parte del Comité de Defensa Civil Nacional o Departamental, así como de ayuda humanitaria. Ante esta situación hemos trabajado dentro de un marco de actuación donde nuestro principal eje de trabajo esta centrado en el municipio como base de la división política

administrativa del país, reconociendo la autoridad de los Alcaldes municipales con quienes estamos llevando a cabo la tarea de organizar y preparar a su población ante cualquier desastre.

Este proyecto ha despertado interés en otros organismos que han decidido apoyarnos, tal es el caso de la Cruz Roja Española y el de la Secretarías de la Presidencia que han estado anuentes a cualquier solicitud de apoyo.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 Nombre del Proyecto:

- **FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DEFENSA CIVIL MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE DE CHINANDEGA Y LEÓN.**

1.2 Fase y duración del Proyecto.

Pre-Inversión : Inversión : U\$80,000.00./ U\$10.000.00 Municipio.
Inicio : 05/99 Finalización : 08/99 Primera Etapa.
Proyecto continua con coordinaciones e investigaciones hasta finalizar el año.

Meses : 4

1.3 Tipo de Proyecto:

Infraestructura : Capacitación : ✓ Social:
Medio Ambiente : Productivo :
Otros: Equipamiento: ✓

1.4 Ente solicitante y/o dueño del proyecto.

10 Alcaldías de Chinandega y León Norte.

1.5 Unidad responsable de la ejecución del proyecto.

Defensa Civil de la Región II. Mayor Narváez. 21 de abril de 1999.

1.6 Nombre, cargo y número de teléfono del responsable de la ejecución del montaje.

Arq. Ansia Alvarez – 0311 0165

1.7 Nombre, cargo y oficina del responsable de revisión y aprobación.

Dra. Elfriede Maussner, Asesora Técnica Principal, PROCHILEON y Lic. Yader Baldizón (FES).

1.8 Beneficiarios del Proyecto.

La población beneficiaria la constituyen 137,170 habitantes de los 10 municipios.

1.9 Antecedente y situación actual del proyecto.

Los 10 municipios atendidos por el Proyecto fueron seriamente afectados por el desastre natural del MITCH y de éstos sólo 5 municipios, por experiencia particular de tener inundaciones locales, practicaron formas de rescate y evacuación por haberse preparado con anterioridad, pero ésta estaba definida para atender algunas comunidades y no todo el municipio.

1.10 Descripción del Proyecto.

Consiste básicamente en:

- Organizar, capacitar y constituir a los Comités Municipales de Defensa Civil en los 10 municipios
- Capacitar y entrenar a las brigadas de primeros auxilios y búsqueda, salvamento y rescate en cada uno de los 10 municipios
- Dotación de manuales sobre la Defensa Civil a las 10 Alcaldías
- Equipar a las brigadas en cada municipio con los equipos básicos para funcionar en situación de emergencia
- Elaboración del Plan de Emergencia de cada uno de los municipios incluyendo mapas(riesgo, amenaza y emergencia)
- Dotación de medios de comunicación, con frecuencia comunitaria (comunicación con policía, MINSA, Defensa Civil).
- Realización de ejercicio demostrativo.

1.11 Justificación del Proyecto.

Según resultados de la "Reflexión Post-MITCH", la mayor debilidad que presentaron las municipalidades fue la falta de organización y en algunos casos de capacidad y preparación para ayudar a los pobladores que sufrieron mayores perjuicios y que ante una nueva situación de emergencia necesitan estar preparados.

2. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ESPERADOS.

- Para junio de 1999 estarán organizados y capacitados 10 Comités Municipales de Defensa Civil
- Para junio de 1999, en cada una de las 10 municipalidades, estarán organizadas y capacitadas 2 brigadas en Primeros Auxilios y Búsqueda, Salvamento y Rescate (15 integrantes cada una), para un total de 300 personas preparadas
- Para Agosto de 1999 se tendrá la publicación y entregados 300 ejemplares de manuales para las 10 municipalidades de manera equitativa, sobre el tema de la Defensa Civil, así como, publicación sobre temas relacionados con el trabajo y funcionamiento de la Defensa Civil en los diferentes territorios
- Para Agosto de 1999 los 10 municipios contarán con un Plan de Emergencia Municipal (mapas de riesgo, amenazas y emergencia)
- Para Agosto de 1999 los 10 municipios contarán con el equipamiento básico para ser efectivo el rescate y auxilio a la población en situación de emergencia
- Para junio de 1999 se dispondrá de las coordinaciones necesarias que le permitirá a las diferentes municipalidades fortalecer las estructuras que garanticen respuestas rápidas y ágiles ante emergencias
- Para Julio de 1999, se contarán con los mecanismos coordinación al nivel de los Foros tanto de León como de Chinandega
- A partir de Agosto de 1999, se podrá evaluar los alcances de este proyecto
